

T3 - Definición del alcance y planificación inicial

¿Qué vamos a hacer exactamente y hasta dónde?

Proyecto Software

Grado en Ingeniería Informática

Escuela Politécnica de Teruel

Universidad de Zaragoza

¿Qué es el alcance de un proyecto?

*El alcance define **qué se incluye y qué se excluye** del proyecto.*

El alcance de un proyecto define:

- **qué se va a construir,**
- **qué no se va a construir,**
- **y qué se espera entregar** al finalizar el proyecto.

El alcance no es:

- una lista de ideas,
- ni una visión ideal del producto,
- ni un deseo del cliente sin restricciones

Aplicación web para la gestión de reservas y turnos de un pequeño gimnasio

Varios perfiles de usuario (clientes, personal y administración), plazo de entrega fijo y recursos limitados.

El alcance podría incluir:

- gestión de reservas,
- gestión de turnos,
- consulta de disponibilidad.

Y excluir explícitamente:

- pagos online,
- app móvil,
- integración con dispositivos externos.

Definir el alcance implica aceptar que **no todo cabe**.

Alcance deseado vs. alcance viable

*El **alcance deseado** representa el producto ideal*

El **alcance viable** representa lo que puede hacerse realmente.

Aplicación web para la gestión de reservas y turnos de un pequeño gimnasio

Alcance deseado:

- reservas online,
- pagos integrados,
- cancelaciones automáticas,
- notificaciones,
- informes,
- app móvil.

Restricciones

- plazo cerrado,
- equipo reducido,
- sin presupuesto adicional.

¿Qué funcionalidades se eliminan?

¿Cuáles se reducen o simplifican?

¿Cuáles se posponen fuera del proyecto?

Priorización de funcionalidades

*Priorizar significa decidir **qué aporta más valor con el menor coste.***

Priorizar implica decidir:

- qué aporta más valor,
- qué es imprescindible,
- qué puede esperar.

Una mala priorización provoca:

- mucho trabajo con poco impacto,
- funcionalidades “bonitas” pero inútiles,
- falta de un producto utilizable.

La priorización no es técnica, **es estratégica.**

Aplicación web para la gestión de reservas y turnos de un pequeño gimnasio

Lista inicial de funcionalidades

- alta de usuarios,
- gestión de reservas,
- cancelación de reservas,
- pagos online,
- notificaciones por email,
- informes de uso.

Clasificar cada funcionalidad en:

- imprescindibles,
- deseables,
- prescindibles.

Imprevisto: Se reduce el plazo o se introduce una carga extra inesperada.

Hitos y entregables

Un proyecto no se controla por “sensaciones de avance”, sino mediante:

- **hitos**: puntos de control relevantes,
- **entregables**: evidencias concretas de progreso.

Los hitos permiten:

- evaluar el estado real del proyecto,
- detectar desviaciones,
- tomar decisiones a tiempo.

*Un **hito** sin entregable es irrelevante. Un **entregable** sin criterio es inútil.*

Aplicación web para la gestión de reservas y turnos de un pequeño gimnasio

Definición de hitos intermedios

- Se pide definir varios hitos para el proyecto del gimnasio

Análisis de cada hito


- Para cada uno, se pregunta:
 - ¿qué se podrá evaluar en ese punto?
 - ¿qué evidencia concreta habrá?
 - ¿qué decisión permitiría tomar?.

Relación entre alcance, tiempo y coste

En cualquier proyecto software existen al menos tres variables fundamentales:

- **Alcance:** qué se va a construir.
- **Tiempo:** plazo disponible.
- **Coste / recursos:** personas, esfuerzo, presupuesto.

Estas variables **no son independientes**. Forman un sistema interrelacionado.

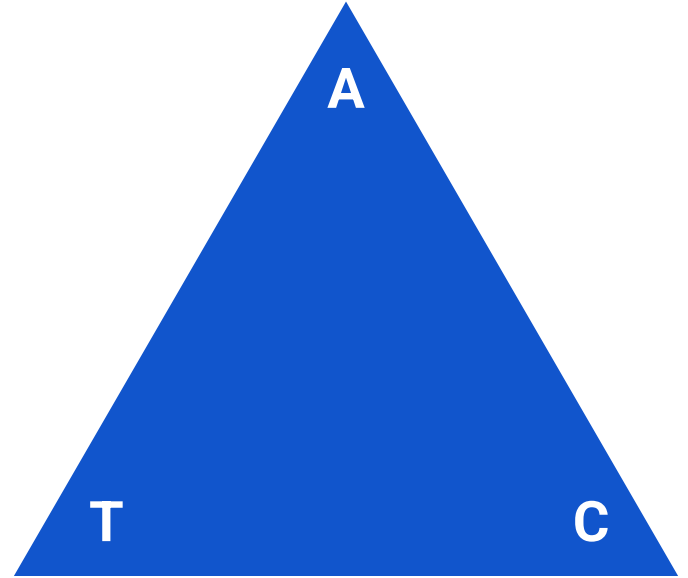

Aplicación web para la gestión de reservas y turnos de un pequeño gimnasio

En el proyecto del gimnasio se establece que:

- el plazo de entrega es **inamovible** (por ejemplo, inicio de temporada),
- el equipo es reducido,
- no hay presupuesto adicional.

El tiempo, por tanto, queda **fijado**.

Ante esta situación, **¿qué opciones reales tiene el proyecto?**

Planificación inicial realista

La planificación inicial no pretende:

- acertar todos los detalles,
- ni prever todos los problemas.

Pretende:

- establecer un marco realista,
- identificar riesgos tempranos,
- y facilitar la toma de decisiones futuras.

Una buena planificación inicial:

- asume incertidumbre,
- deja margen de ajuste,
- y se revisa periódicamente.

Aplicación web para la gestión de reservas y turnos de un pequeño gimnasio

Proyecto del gimnasio (primeras 3 semanas)

- **Semana 1**
 - definición de alcance mínimo
 - priorización inicial
 - configuración básica del repositorio
- **Semana 2**
 - implementación reservas básicas
 - pruebas iniciales
- **Semana 3**
 - ajustes según problemas detectados
 - revisión del plan

Conclusión

Definir el alcance y planificar no limita el proyecto, lo hace viable y gobernable.

Si ya se ha definido qué se va a hacer y se ha planificado, ¿se puede conocer el esfuerzo necesario?
